

第40回 大鹿村リニア連絡協議会を開催

・リニア工事による影響調査の情報や住民意見を共有し、リニア工事全般に関わる事項について連絡調整を行うことを目的に、J R東海、施工業者、長野県、大鹿村及び住民による「大鹿村リニア連絡協議会」が6月15日、交流センターに於いて関係者49名が出席し開催されました。以下に概要をお知らせします。

■第40回 リニア連絡協議会

○第10期正副会長を選出 (会長) 森上 安弘 (副会長) 加藤 哲夫

○委員の構成

(大鹿村関係委員) 大鹿村議会、農業委員会、教育委員会、商工会、建設業協会、飯伊砂利組合、
下伊那漁業組合大鹿支部、村内27自治会長、大鹿村

(長野県関係委員) 飯田建設事務所、リニア整備推進事務所、南信州地域振興局 各担当者

(リニア事業関係委員) J R東海、施工業者

① 県発注工事について

■(主) 松川インター大鹿線について、実施中及び今後実施予定の箇所について説明がありました。

① 道路改良工事(葛島): 測量設計、関係機関協議

河川側に盛土をして、道路を拡幅する工事で、今後、保安林解除申請の手続きを行う予定。

② 道路改良工事(二軒屋): 関係機関協議、松川町側道路拡幅工事完了

③ 道路改良工事(半の沢): 盛土造成工事

④ 防災対策工事(四徳大橋西): 本工事(R8年度後半着手予定)

⑤ トンネル工事(落合): トンネル工事

○ その他工事

・修繕工事(橋梁補修): こいけどう橋(R8.7月頃予定・交通規制なし)
: 松除3号橋(R8秋頃・舗装打換えあり)

○(国) 152号下樽渡橋の架替工事について、現橋の撤去、河川内の橋脚及び両岸の下部工が完了しました。
現在は上部工を工場で製作中。令和9年度完成予定。



■半の沢の迂回路について



・半の沢橋の撤去に伴う、迂回路の使用を開始します。

迂回路使用期間: 令和8年9月上旬~令和9年度冬頃(予定)

・迂回路工事に伴う工事用車両出入口の変更と、一時的な交通規制を実施します。交通誘導員や工事看板の案内による通行にご協力をお願いします。


①迂回路(大鹿村側)工事に伴う工事用車両出入口の変更
出入口変更期間: 令和8年6月中旬~令和8年7月上旬

②半の沢橋前後の白線設置に伴う一時的な交通規制
交通規制期間: 令和8年お盆明けの1日程度

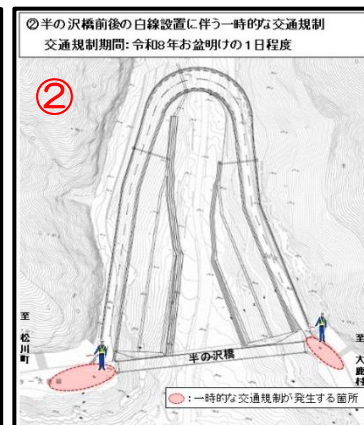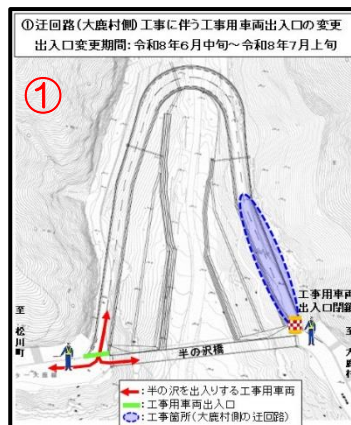

② 南アルプストンネル長野工区の工事状況について

- ・除山非常口から先進坑及び本坑を掘削しています。
- ・小渋川非常口から本坑を掘削しています。

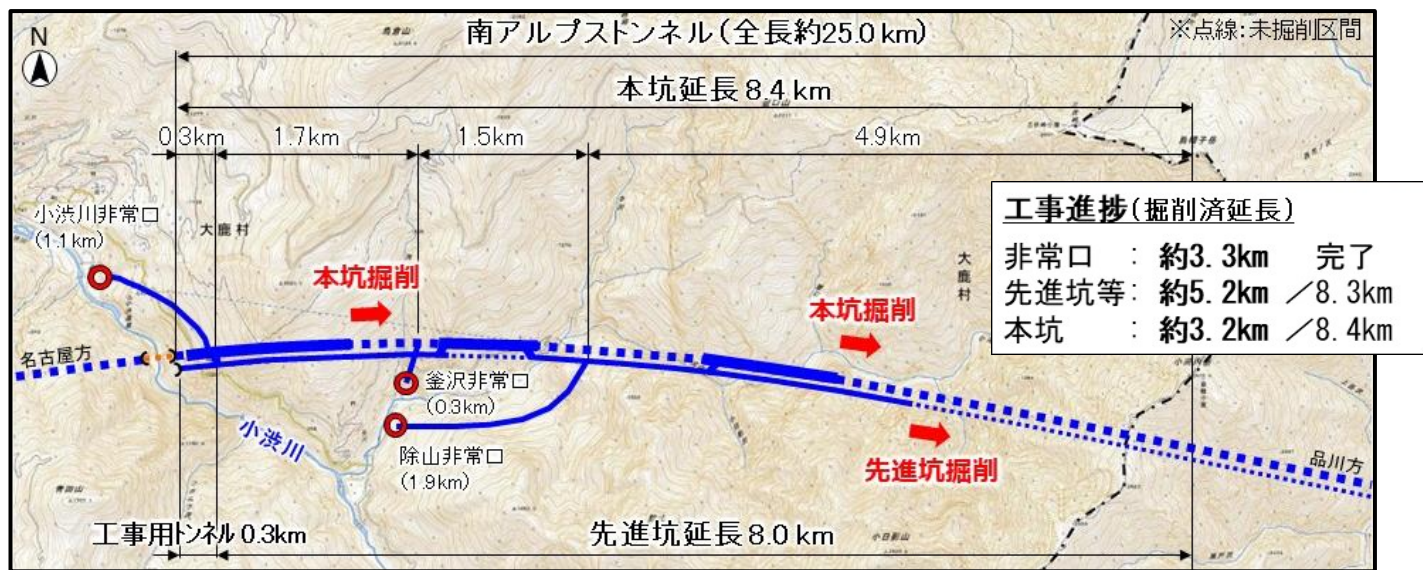

③ 伊那山地トンネル青木川工区の工事状況について

- ・青木川非常口から本坑を掘削しています。



③ 発生土仮置き場の状況について

- ・発生土仮置き場B(三正坊)は、発生土の搬出がほぼ完了しています。
また、仮置き場の復旧について、大鹿村をはじめ関係者と協議を進めています。
- ・発生土仮置き場E(小渋川変電所予定地)は、発生土の搬出入を行っています。
- ・6月上旬に飯田市内(土曽川橋りょう)への要対策土運搬(2回目)が完了しました。



④ 小渋川橋りょう・小渋川変電所等の状況について

- ・小渋川橋りょうでは、工事用仮栈橋の設置工事を進めています。
- ・小渋川変電所では、村道上蔵河原線の嵩上げ工事として、河川側への迂回路の振替が完了しました。今後、準備が整い次第、小渋川変電所の工事（擁壁工）に着手してまいります。
- ・秋頃から擁壁の中詰め材に要対策土を活用する予定です。



⑤ 工事用車両台数について

■資機材運搬車両

	月別日平均 往復台数	下青木 薬師堂前	沢戸橋	大鹿村 役場前	半の沢	渡場 交差点
資機材運搬車両	2026.3月	59.5	101.6	50.4	51.4	51.4
	2026.4月	65.9	79.4	34.7	36.2	36.2
	2026.5月	54.7	66.3	31.0	33.0	33.0

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日で割り戻した数値です。

■発生土運搬車両

	月別日平均 往復台数	下青木 薬師堂前	沢戸橋	大鹿村 役場前	半の沢	渡場 交差点
発生土運搬車両 JR工事による	2026.3月	207.7	211.2	351.5	351.5	457.5
	2026.4月	216.4	226.5	395.1	395.1	504.3
	2026.5月	207.8	171.9	379.6	379.6	500.6
半の沢道路改築事業 への発生土運搬車両	2026.3月		182.0	182.0	182.0	
	2026.4月		182.5	182.5	182.5	
	2026.5月		236.3	236.3	236.3	
蕎麦ヶ原沢環境対策事業 への発生土運搬車両	2026.3月		67.4			
	2026.4月		47.8			
	2026.5月		0.0			

⑥ 2026年度にかけての工事用車両運行計画について

(発生土運搬先)	2026年				2027年
	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
小渋川変電所敷地造成(大鹿村)					
蕎麦ヶ原沢環境対策事業(大鹿村)					
新宮川岸地区土地改良事業(駒ヶ根市)					
小和田地区基盤整備事業(中川村)					
前河原道路新設事業(松川町)					
半の沢道路改築事業(中川村)					
中央新幹線長野県駅新設工事(飯田市)					

※小渋川変電所敷地造成：工事準備に伴い、発生土運搬の開始時期を7月から9月に変更しました。

※半の沢道路改築事業：小渋線の通行台数低減のため、半の沢橋撤去中も発生土運搬を行うこととしました。

⑦ 工事用車両通行台数の予定について

【往復台数】

		2026年7月		2026年8月		2026年9月	
		月別 日平均	日最大	月別 日平均	日最大	月別 日平均	日最大
資機材運搬		50	60	50	60	50	60
発生土運搬	新宮川岸地区土地改良事業 (駒ヶ根市中沢)	40	60	—	—	—	—
	小和田地区基盤整備事業 (中川村小和田)	370	400	410	460	410	460
	半の沢道路改築事業 (中川村葛島)	200	240	200	240	200	240
	前河原道路新設事業 (松川町古町)	60	80	60	80	60	80
合計		720	840	720	840	720	840

⑧ 特殊車両の夜間通行について

(仮称) 落合トンネル分岐部施工期間

- 交通規制に対応するために、平日の20時～翌5時あるいは土曜日・日曜日の21時～翌5時にも通行する可能性がありますので、ご理解とご協力をお願い致します。

期 間 (予定) 主な作業内容	方 向	昼 間(5時～20時)		夜 間(20時～翌5時)	
		晴 天 時	大 雨 時	晴 天 時	大 雨 時
令和8年 6月5日(金)朝 ～令和9年1月末 トンネル分岐部施工	中川村→大鹿村	新トンネルを通行	新トンネルを通行 ※工事区間は 片側交互通行	大鹿トンネル旧道を 通行 ※片側交互通行	新トンネルを通行 ※工事区間は 片側交互通行
	大鹿村→中川村	大鹿トンネル旧道を 通行			

交通規制の概要(長野県資料より抜粋)

⑨ 鷲ヶ巣沢環境対策事業の状況について

- 護岸工、土留擁壁工、根固工が完成し、河川内の作業が終了しました。
- 今後は、盛土工、地下排水工、堰堤工を施工してまいります。



○次回(第41回)開催日程等について

- 次回開催時期を令和8年9月とし閉会しました。
